



« Мой город. Школьники. »

Прасолова Ю.А., к.п.н., ведущий научный консультант Регионального центра финансовой грамотности

**Школьное инициативное бюджетирование
2024: минимизация ошибок и рисков**



Стратегические ошибки 2023

№	Ошибка	Минимизация ошибок и рисков
1	Отсутствие в команде постоянного финансово-экономического блока от начала до полного завершения Проекта	Назначение Приказом по ОУ представителя ФЭБ как постоянного члена команды Проекта ШКИБ, определение функций и задач
2	Не просчитаны риски реализации : инфляция, замена поставщиков, возможный вандализм, заболевание растений и др.	Освоить методику рискменеджмента в доступных, но необходимых вариантах (запросить консультацию, обязательно посетить установочную очную сессию)
3	Замена понятия «проектная деятельность» закупкой определенного оборудования и др.	Оформление проектных идей в соответствии с рекомендациями пошагового развития каждого проекта
4	Отсутствие проектного шага «Развитие проекта после его завершения»	Предусмотреть в описании и в Заявке по каждому проекту
5	Не определен единый Ответственный за реализацию всего Проекта ШКИБ	Назначение Приказом по ОУ Ответственного лица с конкретными функциями
6	Ограничена роль школьников (идея и голосование)	Продумать деятельностный аспект роли учащихся

Команда группового проекта и командные роли

Модель командных ролей В проекте ШКИБ



Упрощенный вариант Команды проекта

- Руководитель/контролер
- Менеджер/снабженец
- Генератор идей
- Бухгалтер
- IT – специалист/пресс-служба
- Исполнители/привлеченные специалисты, школьники

Проектная команда — это совокупность людей, имеющих различные компетенции, должности, опыт, знания и ответственность, и объединенных общей целью — успешным завершением проекта

Команда проекта – временная организационная структура, объединяющая отдельных специалистов, группы и/или организации, привлечен к выполнению работ проекта и ответственные перед руководителем проекта за их выполнение. Команда проекта создается целевым образом на период осуществления проекта.



Миссия и роль администрации школы

Создание условий для активной проектной деятельности

Мотивация и поддержка


Нормативно-правовое обеспечение

Координация деятельности

Содействие в организации технической экспертизы

**Оформление Заявки.
Отчетность.**

Не забываем об ответственности Директора ОУ

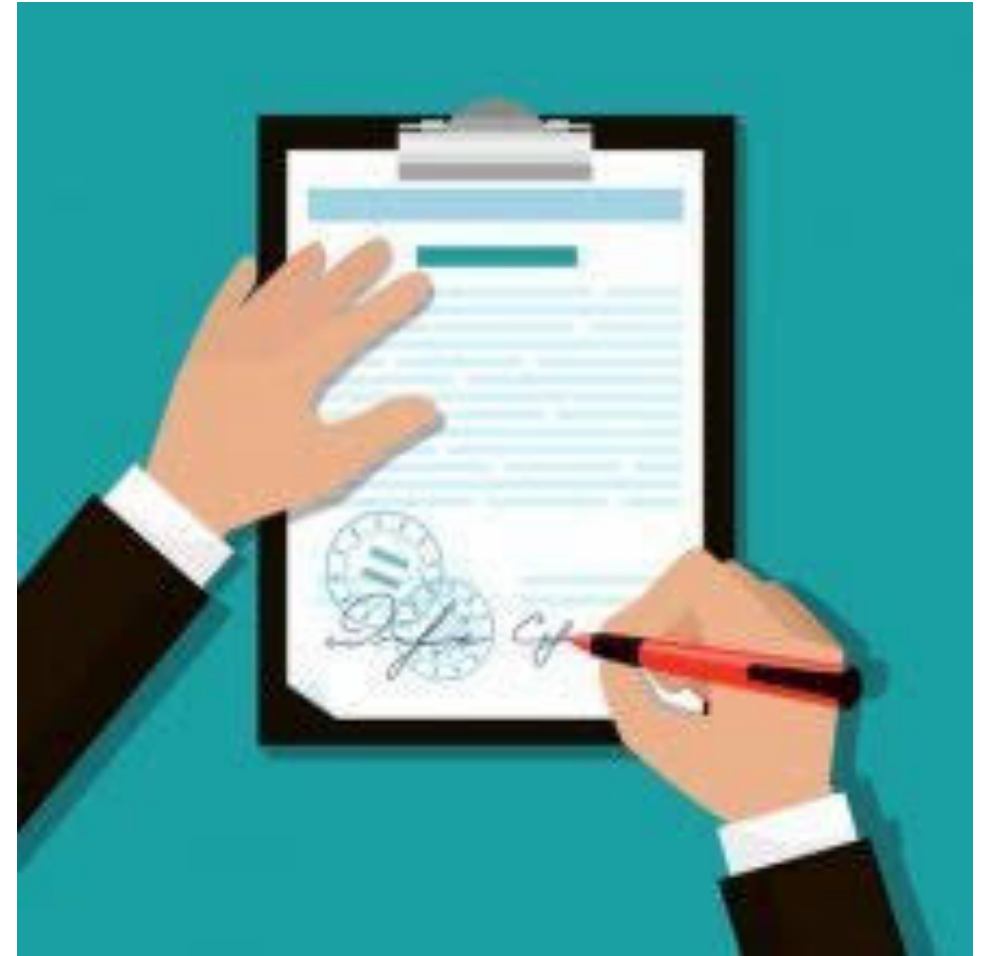



Задачи финансово-экономического блока

Консультации по бюджету на стадии проектных идей

Помощь проектным командам в оформлении бюджетной части проектов для общей Заявки ОУ по Проекту ШКИБ

Участие в совещаниях при Директоре по реализации Проекта ШКИБ

Ответственность за бюджетную составляющую итоговой отчетности ОУ по Проекту ШКИБ





Роли педагогов – участников проектной команды

Ответственное лицо Проекта:
куратор проектной
деятельности по ШКИБ в ОУ,
контактное лицо с оператором
Проекта, главный менеджер,
связующее звено между
администрацией и кураторами
проектов

Педагоги-кураторы: педагог,
сопровождающий
деятельность команды
школьников по каждому
проекту (от стадии
формирования проектной
команды до итоговой
отчетности)





Роли и задачи школьников – участников проектной команды

Поиск и оформление проектной идеи, анкетирование и опросы, популяризация проекта своей команды, организация голосования

Презентация проекта команды, участие в оформительских, подготовительных работах к началу реализации проекта, помощь в реализации проекта, разъяснительная работа по бережному отношению к результатам проекта и др.





Благодарим за внимание!
